




















ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	01/09/13	15/09/13	29/09/13	13
1	Organização	5 dias	Qui 19/09/13	Qua 25/09/13				
2	Escolha do tema	4 dias	Qui 19/09/13	Ter 24/09/13				
3	Distribuição de cargos	1 dia	Qua 25/09/13	Qua 25/09/13				
4	Documentação	75 dias	Qua 25/09/13	Ter 07/01/14				
5	Manual de Qualidade	10 dias	Qua 25/09/13	Ter 08/10/13				
6	Regras da equipa	4 dias	Qua 25/09/13	Seg 30/09/13				
7	Regras de documentação e organização do repositório	6 dias	Ter 01/10/13	Ter 08/10/13				
8	Market Survey	11 dias	Ter 01/10/13	Ter 15/10/13				
9	Leitura de relatórios da competição de anos anteriores	5 dias	Ter 01/10/13	Dom 06/10/13				
10	Pesquisa e escolha do material	7 dias	Seg 07/10/13	Ter 15/10/13				
11	Relatório de Requisitos	5 dias	Qua 09/10/13	Ter 15/10/13				
12	Leitura das regras e especificações do concurso	3 dias	Qua 09/10/13	Sex 11/10/13				
13	Levantamento dos requisitos mais importantes com o cliente	1 dia	Sáb 12/10/13	Sáb 12/10/13				
14	Especificação dos Requisitos	3 dias	Dom 13/10/13	Ter 15/10/13				
15	Conceito do Sistema	5 dias	Qua 16/10/13	Ter 22/10/13				
16	Desenvolvimento do SBS	3 dias	Qua 16/10/13	Sex 18/10/13				
17	Desenvolvimento do System Concept	3 dias	Sáb 19/10/13	Ter 22/10/13				
18	Relatório de Qualidade e Risco	5 dias	Qua 23/10/13	Ter 29/10/13				
19	Levantamento dos Riscos existentes	2 dias	Qua 23/10/13	Qui 24/10/13				




















Projeto: Gantt_v1.2_TR Data: Ter 26/11/13	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
	Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
	Marco		Apenas-duração		Prazo	
	Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
	Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
	Tarefa Inativa		Apenas início			
	Marco Inativo		Apenas-conclusão			


ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	01/09/13	15/09/13	29/09/13	13
20	Atribuição de probabilidade e importância da ocorrência de cada risco	1 dia	Qui 24/10/13	Qui 24/10/13				
21	Mitigação e atribuição de um responsável para cada risco	3 dias	Sex 25/10/13	Ter 29/10/13				
22	Relatório detalhado do Sistema	10 dias	Qua 30/10/13	Ter 12/11/13				
23	Elaboração do documento	10 dias	Qua 30/10/13	Ter 12/11/13				
24	Análise de Custo	11 dias	Ter 19/11/13	Ter 03/12/13				
25	Custos diretos	10 dias	Ter 19/11/13	Sáb 30/11/13				
26	Custos indiretos	10 dias	Ter 19/11/13	Sáb 30/11/13				
27	Custo total e análise dos custos	3 dias	Dom 01/12/13	Ter 03/12/13				
28	Relatório Final	15 dias	Qua 18/12/13	Ter 07/01/14				
29	Implementação	29 dias	Ter 29/10/13	Sex 06/12/13				
30	Análise e Processamento de Imagem	29 dias	Ter 29/10/13	Sex 06/12/13				
31	Deteção das cores do alvo	13 dias	Ter 29/10/13	Qui 14/11/13				
32	Algoritmia	7 dias	Ter 29/10/13	Qua 06/11/13				
33	Testes	6 dias	Qui 07/11/13	Qui 14/11/13				
34	Deteção da forma do alvo	4 dias	Sex 15/11/13	Qua 20/11/13				
35	Algoritmia	2 dias	Sex 15/11/13	Dom 17/11/13				
36	Testes	3 dias	Seg 18/11/13	Qua 20/11/13				
37	Deteção da orientação do alfanumérico	4 dias	Qui 21/11/13	Ter 26/11/13				
38	Algoritmia	3 dias	Qui 21/11/13	Sáb 23/11/13				
39	Testes	3 dias	Dom 24/11/13	Ter 26/11/13				
40	Deteção da cor do alfanumérico	3 dias	Qua 27/11/13	Dom 01/12/13				
41	Algoritmia	3 dias	Qua 27/11/13	Sex 29/11/13				

Projeto: Gantt_v1.2_TR Data: Ter 26/11/13	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
	Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
	Marco		Apenas-duração		Prazo	
	Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
	Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
	Tarefa Inativa		Apenas início			
	Marco Inativo		Apenas-conclusão			

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	01/09/13	15/09/13	29/09/13	13
42	Testes	2 dias	Sáb 30/11/13	Dom 01/12/13				
43	Deteção da forma do alfanumérico	5 dias	Seg 02/12/13	Sex 06/12/13				
44	Algoritmia	3 dias	Seg 02/12/13	Qua 04/12/13				
45	Testes	2 dias	Qui 05/12/13	Sex 06/12/13				
46	Controlo voo autónomo	24 dias	Ter 05/11/13	Sex 06/12/13				
47	Interligação e configuração dos softwares necessários	9 dias	Ter 05/11/13	Sex 15/11/13				
48	Realizar tutorial do Dune	2 dias	Sáb 16/11/13	Seg 18/11/13				
49	Simular uma missão básica com descolagem, aterragem e rota incluídas	10 dias	Ter 19/11/13	Sáb 30/11/13				
50	Controlo voo autónomo	5 dias	Dom 01/12/13	Sex 06/12/13				
51	Algoritmia	3 dias	Dom 01/12/13	Ter 03/12/13				
52	Testes	3 dias	Qua 04/12/13	Sex 06/12/13				
53	Captação automática da imagem	24 dias	Ter 05/11/13	Sex 06/12/13				
54	Interligação da máquina com o sistema	12 dias	Ter 05/11/13	Qua 20/11/13				
55	Simulação de captação de imagens de forma automática	12 dias	Qui 21/11/13	Sex 06/12/13				
56	Algoritmia	8 dias	Qui 21/11/13	Sáb 30/11/13				
57	Testes	6 dias	Dom 01/12/13	Sex 06/12/13				
58	Payload Drop	24 dias	Ter 05/11/13	Sex 06/12/13				
59	Algoritmia	24 dias	Ter 05/11/13	Sex 06/12/13				
60	Integração	8 dias	Sáb 07/12/13	Ter 17/12/13				
61	Integração dos vários componentes do projeto	3 dias	Sáb 07/12/13	Ter 10/12/13				
62	Testes Finais	5 dias	Qua 11/12/13	Ter 17/12/13				


Projeto: Gantt_v1.2_TR
Data: Ter 26/11/13

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
Marco		Apenas-duração		Prazo	
Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
Tarefa Inativa		Apenas início			
Marco Inativo		Apenas-conclusão			

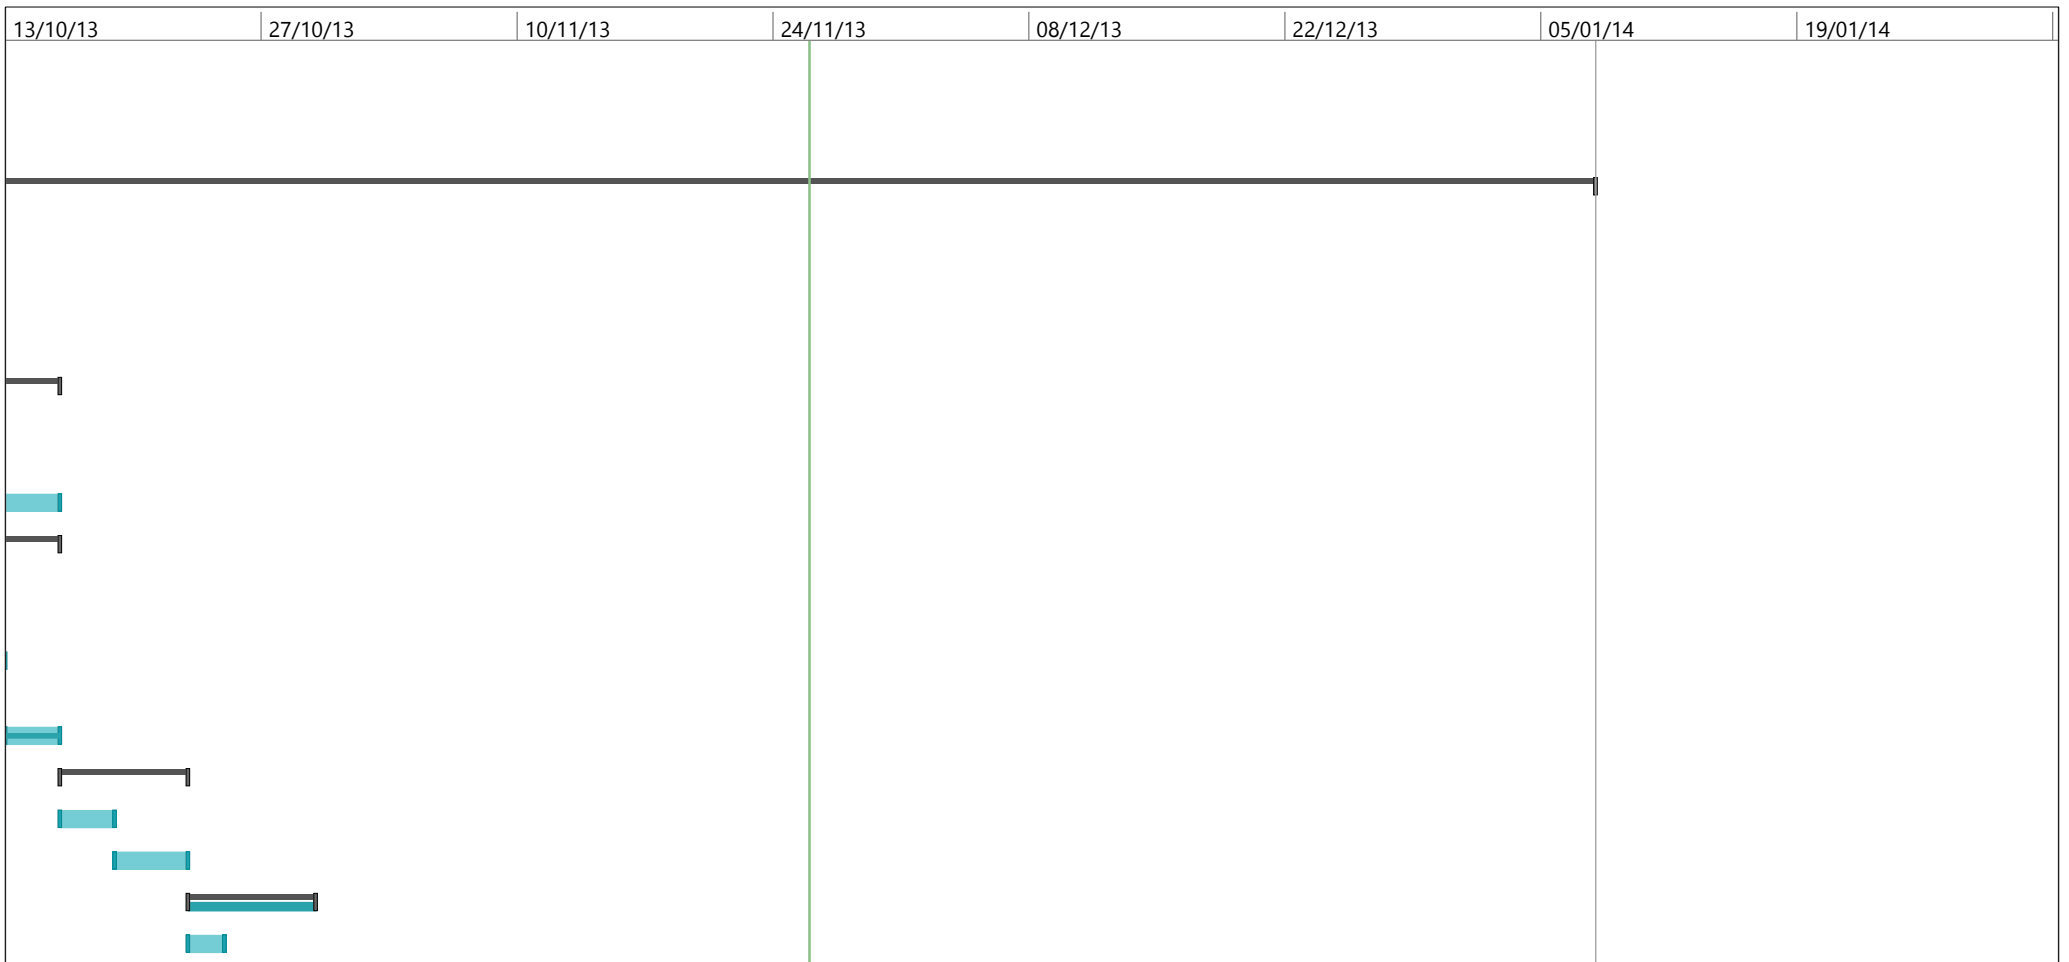


Projeto: Gantt_v1.2_TR
 Data: Ter 26/11/13

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
Marco		Apenas-duração		Prazo	
Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
Tarefa Inativa		Apenas início			
Marco Inativo		Apenas-conclusão			

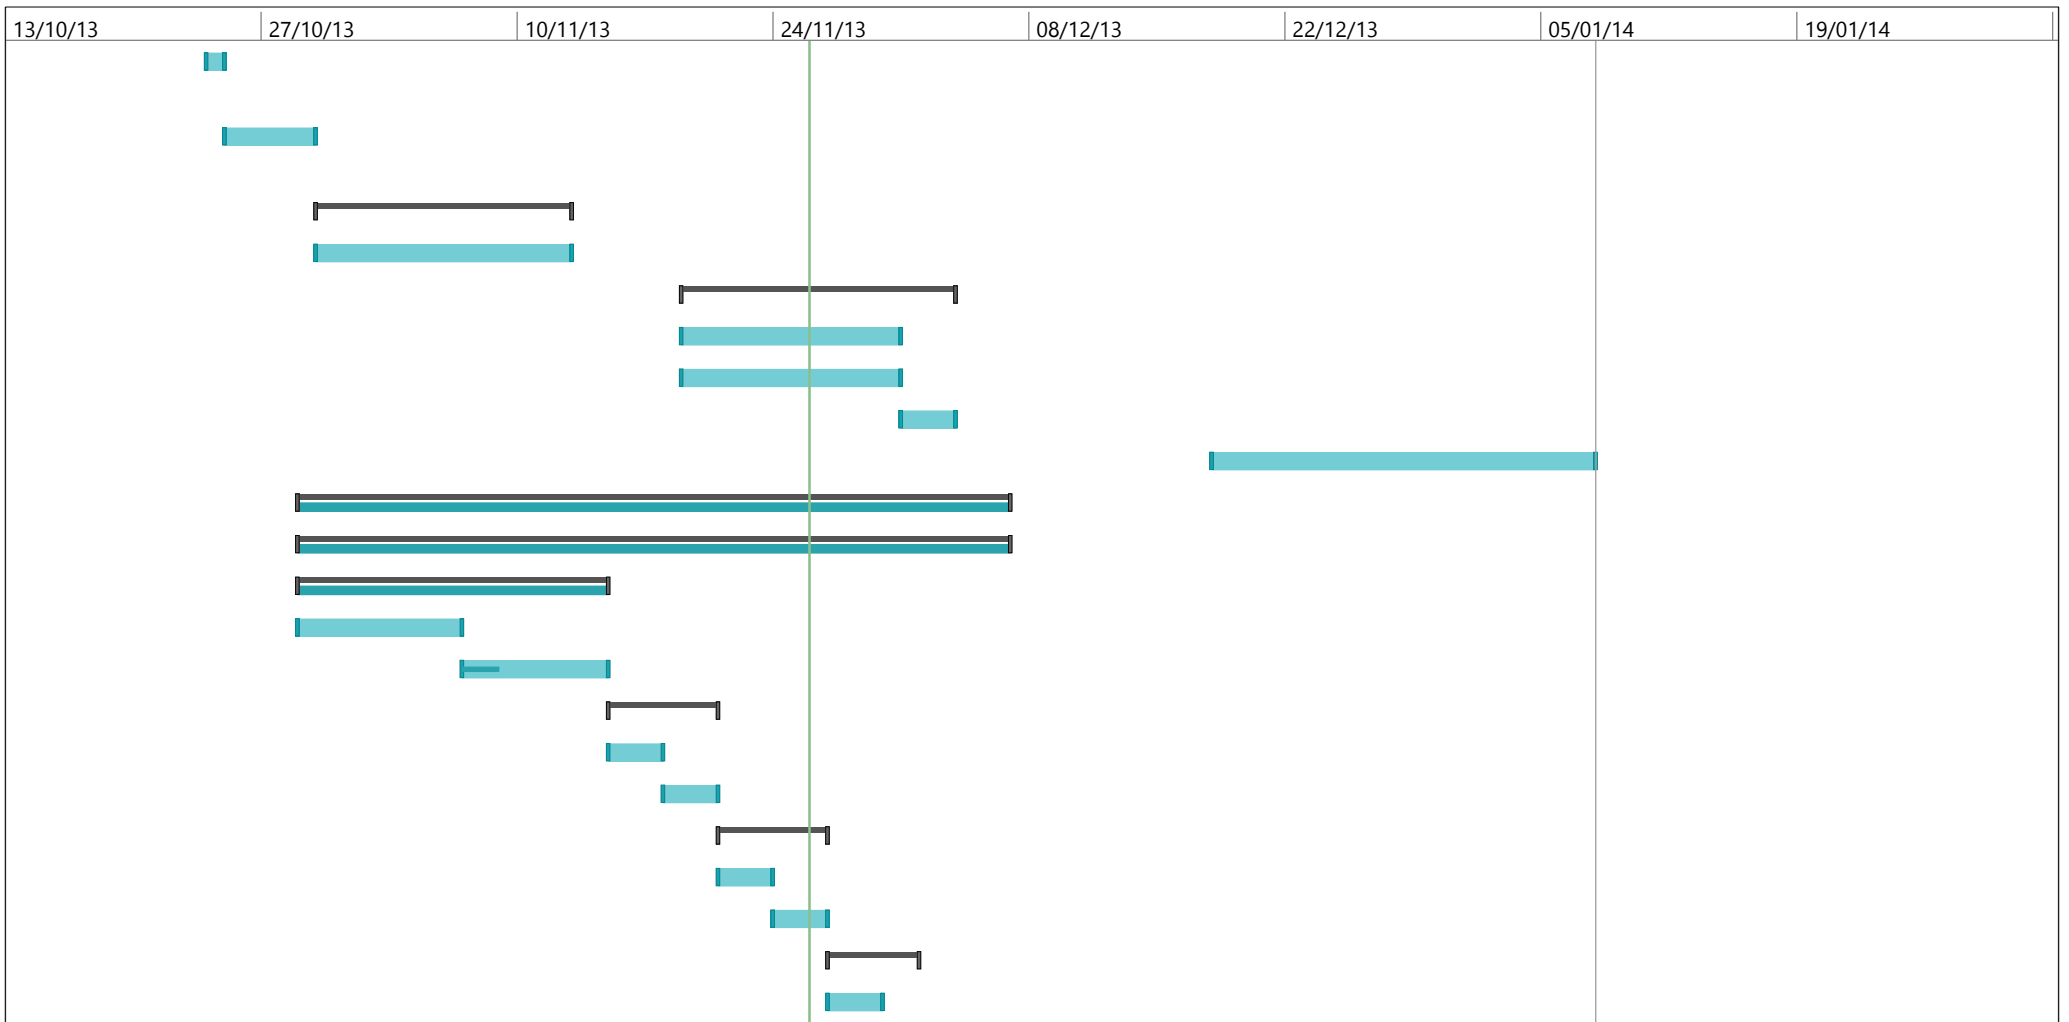

Projeto: Gantt_v1.2_TR
 Data: Ter 26/11/13

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
Marco		Apenas-duração		Prazo	
Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
Tarefa Inativa		Apenas início			
Marco Inativo		Apenas-conclusão			

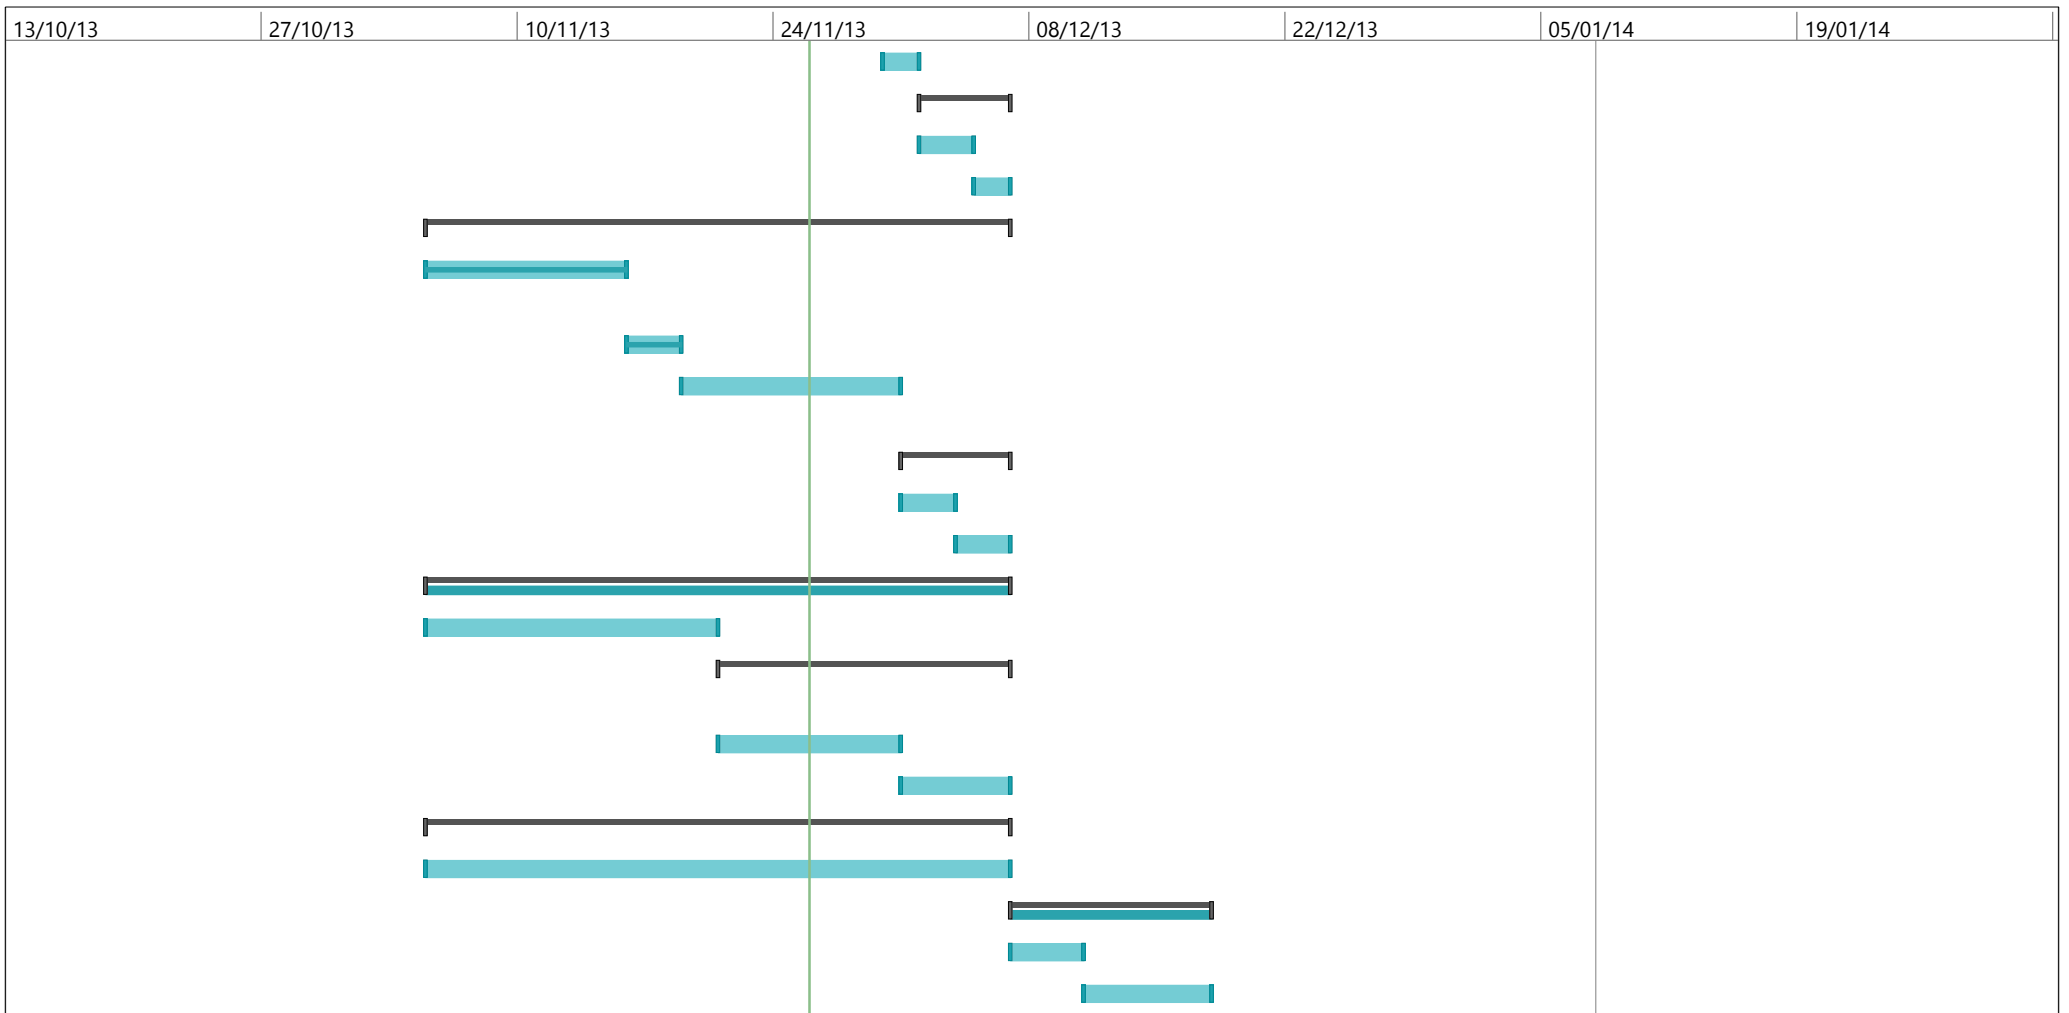

Projeto: Gantt_v1.2_TR
 Data: Ter 26/11/13

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas Externas	
Dividir		Tarefa Manual		Marco Externo	
Marco		Apenas-duração		Prazo	
Sumário		Resumo da Agregação Manual		Progresso	
Resumo de Projeto		Resumo Manual		Progresso Manual	
Tarefa Inativa		Apenas início			
Marco Inativo		Apenas-conclusão			
